

# 采购简报

〔2020〕第3期

招标采购管理办公室

2020年9月29日



## 关于2020年第三季度 学校招标采购项目进展情况的报告

为推动学校招标采购工作顺利开展，及时掌握招标采购项目的完成情况，招标采购管理办公室对经过职能部门审批的项目进行了专项统计，现将有关情况报告如下：


### 一、总体情况

三季度采购预算 2999.22 万元，完成 2606.22 万元，总中标金额 1532.88 万元，节支率 13.10%。

（一）省集采中心采购项目：总预算额 2456.78 万元，总中标金额 2136.64 万元，节支率 13.03%。

（二）校内集中采购：项目总预算额 254.74 万元，总成交金额 242.18 万元，节支率 4.93%。

（三）网上商城采购：项目总预算额 287.7 万元，总成交金额 227.4 万元，节支率 20.96%。

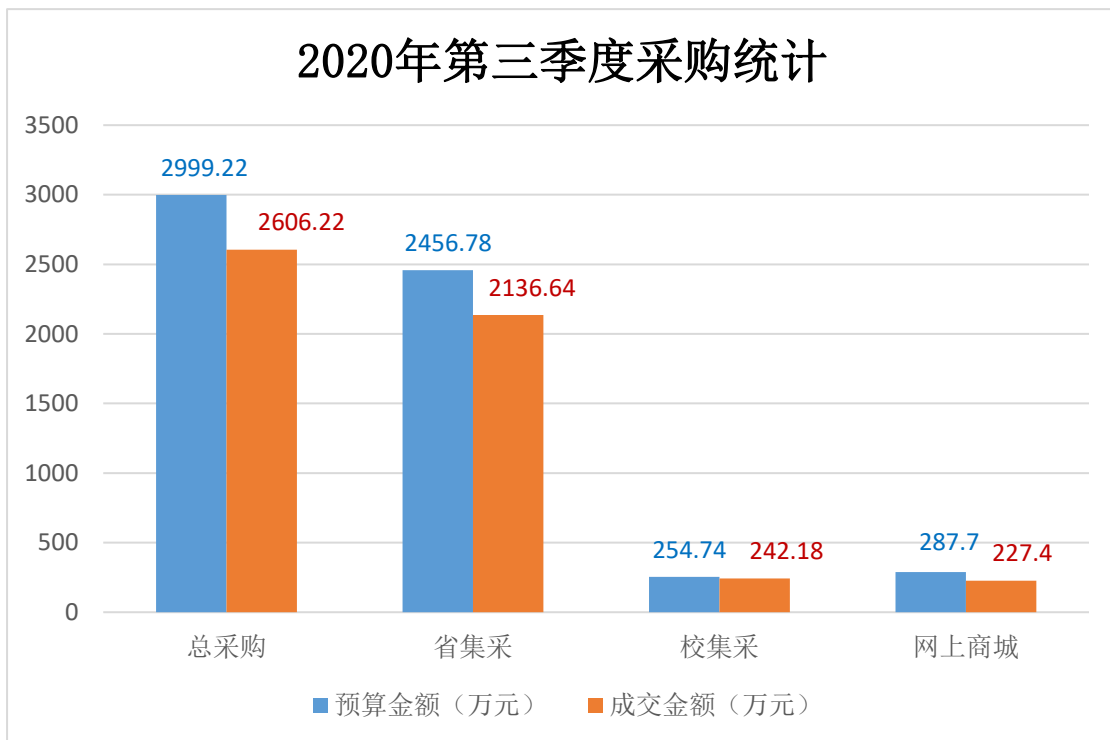

## 二、 重大项目

### (一) 河南科技大学 2020-2022 年教材采购项目

后勤管理处通过办公 OA 申请河南科技大学 2020-2022 年教材采购项目，2020 年 5 月 21 日到达招标办（用时 3 天）；

5 月 22 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6 月 2 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 11 天)；

6 月 16 日发布采购公告，7 月 9 日开标，供应商不足三家；

7 月 10 日发布二次公告，7 月 29 日代理机构发布项目澄清公告；

8 月 3 日完成项目招标(用时 48 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 74 天。

该项目预算 620 万元，中标价 471.2 万元，节支率 24%。

采购申请单位：后勤管理处

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

## **(二) 图书馆 2020 年电子文献采购项目**

图书馆通过办公 OA 申请单一来源采购图书馆 2020 年电子文献项目，2020 年 6 月 23 日到达招标办（用时 7 天）；

6 月 24 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为单一来源招标；

6 月 29 日至 7 月 3 日公示；

7 月 23 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 29 天)；

8 月 3 日发布采购公告；

8 月 13 日完成项目招标(用时 10 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 51 天。

该项目预算 436 万元，共分为 26 个包段，包 1 预算 27 万元，中标价 27 万元，节支率 0%；包 2 预算 30 万元，中标价 30 万元，节支率 0%；包 3 预算 3.5 万元，中标价 3.5 万元，节支率 0%；包 4 预算 11 万元，中标价 11 万元，节支率 0%；包 5 预算 2.5 万元，中标价 2.5 万元，节支率 0%；包 6 预算 3 万元，中标价 3 万元，节支率 0%；包 7 预算 5 万元，中标价 4.95 万元，节支率 1%；

包 8 预算 2.3 万元，中标价 2.24 万元，节支率 2.61%；包 9 预算 6 万元，中标价 6 万元，节支率 0%；包 10 预算 7 万元，中标价 7 万元，节支率 0%；包 11 预算 14.4 万元，中标价 14.398 万元，节支率 0.01%；包 12 预算 5 万元，中标价 5 万元，节支率 0%；包 13 预算 11.7 万元，中标价 11.7 万元，节支率 0%；包 14 预算 23.8 万元，中标价 23.8 万元，节支率 0%；包 15 预算 9.9 万元，中标价 9.9 万元，节支率 0%；包 16 预算 10 万元，中标价 9.98 万元，节支率 0.2%；包 17 预算 9.6 万元，中标价 9.6 万元，节支率 0%；包 18 预算 3.5 万元，中标价 3.5 万元，节支率 0%；包 19 预算 2.8 万元，中标价 2.8 万元，节支率 0%；包 20 预算 3.5 万元，中标价 3.5 万元，节支率 0%；包 21 预算 9.6 万元，中标价 9.6 万元，节支率 0%；包 22 预算 3 万元，中标价 3 万元，节支率 0%；包 23 预算 56.4 万元，中标价 56.3 万元，节支率 0.18%；包 24 预算 24.8 万元，中标价 24.75 万元，节支率 0.2%；包 25 预算 14.57 万元，中标价 14.32 万元，节支率 1.72%；包 26 预算 5 万元，中标价 5 万元，节支率 0%。

**采购申请单位：图书馆**

**招标采购专业组：国有资产管理处**

**采购管理单位：招标采购管理办公室**

### **(三) 图书馆 2020 年图书、期刊订购项目**

图书馆通过办公 OA 申请图书馆 2020 年图书、期刊订购项目，2020 年 6 月 23 日到达招标办（用时 4 天）；

6 月 24 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

7 月 16 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 22 天)；

7 月 21 日发布采购公告；

8 月 12 日完成项目招标（用时 22 天）；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 50 天。

该项目预算 312 万元，共分为 6 个包段，包 1 预算 60 万元，中标价 39.6 万元，节支率 34%；包 2 预算 60 万元，中标价 40.8 万元，节支率 32%；包 3 预算 60 万元，中标价 37.8 万元，节支率 37%；包 4 预算 47 万元，中标价 31.02 万元，节支率 34%；包 5 预算 47 万元，中标价 28.67 万元，节支率 39%；包 6 预算 38 万元，中标价 25.46 万元，节支率 33%。

采购申请单位：图书馆

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

### **(四) 多媒体教室与标准化考场新建项目**

现代教育技术中心通过办公 OA 申请多媒体教室与标准化考场新建项目，2020 年 4 月 27 日到达招标办（用时 9 天）；

4 月 28 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

6月2日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时35天);

6月8日发布采购公告;

7月2日完成项目招标(用时24天);

该项目自进入招标流程到招标完成历时共66天。

该项目预算293万元,中标价280万元,节支率4.4%。

采购申请单位:图书馆

招标采购专业组:国有资产管理处

采购管理单位:招标采购管理办公室

### 三、重要项目

#### (一) 校园网络出口线路与校区互联光纤租用服务采购项目

网络信息中心通过办公OA申请单一来源校园网络出口线路与校区互联光纤租用服务采购项目,2020年7月19日到达招标办(用时4天);

7月20日招标办报财政厅备案通过,采购方式为单一来源招标;

7月22日至7月28日公示,7月24日至7月31日变更后二次公示;

8月13日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时23天);

8月26日发布采购公告;

9月3日完成项目招标(用时44天);

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 46 天。

该项目预算 178.5 万元，共分为 4 个包段，包 1 预算 42 万元，中标价 42 万元，节支率 0%；包 2 预算 90 万元，中标价 89.28 万元，节支率 0.8%；包 3 预算 12 万元，中标价 12 万元，节支率 0%；包 4 预算 34.5 万元，中标价 33.3 万元，节支率 3.48%；

采购申请单位：网络信息中心

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

## **(二) 激光熔覆增材制造机器人系统项目**

机电工程学院通过办公 OA 申请激光熔覆增材制造机器人系统项目，2020 年 2 月 5 日到达招标办（用时 19 天）；

2 月 5 日招标办报财政厅备案通过，采购方式为公开招标；

3 月 2 日招标办接到申请单位、国资处、审计处会审过的招标文件(用时 26 天)；

4 月 14 日发布采购公告，4 月 15 日更正公告，5 月 8 日开标，有效投标人不足三家，废标；

7 月 21 日发布采购公告，8 月 12 日完成项目招标(用时 120 天)；

该项目自进入招标流程到招标完成历时共 189 天。

该项目预算 130 万元，中标价 122.594 万元，节支率 5.7%。

采购申请单位：机电工程学院

招标采购专业组：国有资产管理处

采购管理单位：招标采购管理办公室

#### **四、 招标采购工作领导小组成员调整**

由于学校中层领导干部换届，为便于更好地开展工作，对我校招标采购工作领导小组进行了调整，组成人员如下：

组 长：李友军

成 员：程 才 侯建设 刘岳文 李 方

张文成 柴建民 钱 昕

领导小组下设办公室，办公室设在招标采购管理办公室。

办公室主任：钱 昕（兼）

招标采购管理办公室

2020年9月29日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

---

主 编：刘岳文

责任编辑：陈祥涛
